



VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA

PIRMOJO JŪRINIO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO „CURONIAN NORD“ BALTIJOS JŪROJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

2025 m. lapkričio 17 d.



2023-10-12

konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo Baltijos jūroje vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai laimėtojais paskelbti UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“, dalyvavę jungtinės veiklos sutarties pagrindu.



2024-02-12

UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ įsteigta projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ išduotas leidimas atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.



60,3 mln. Eur


2023–2025 m. UAB „Ignitis renewables“ panaudojo pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimui (2025-06-30 duomenimis).



52,5 mln. Eur

UAB „Offshore wind farm 1“ pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas AB „Litgrid“, garantuojant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokole nurodytų įsipareigojimų įvykdymą.

Pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimo pagrindinės datos

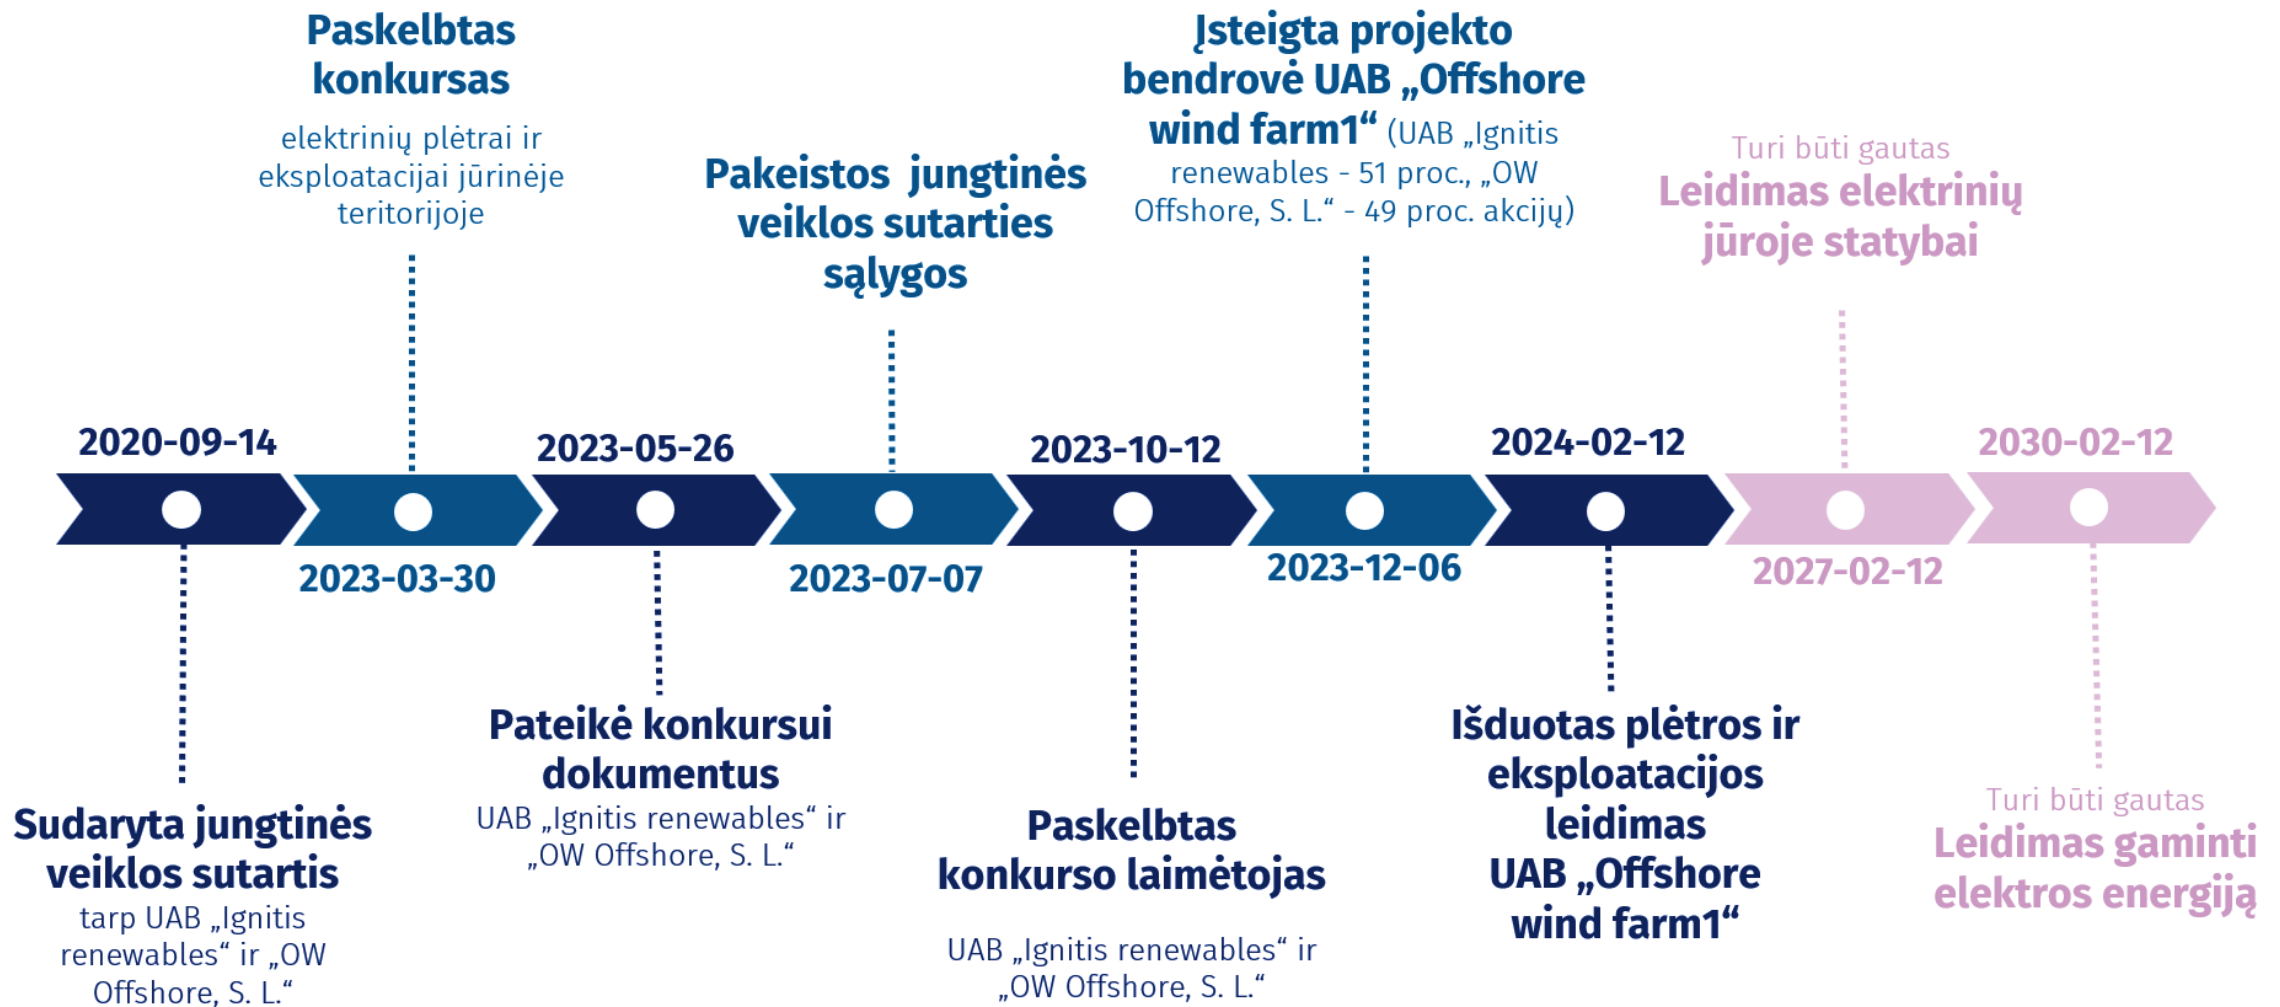

1. Ar AB „Ignitis grupė“ ir jos patronuojamosios bendrovės UAB „Ignitis renewables“ finansinio dalyvavimo projekte modelis (t. y. privataus ir valstybinio kapitalo subjektų bendradarbiavimo ir investavimo schema) atitinka 2023-05-30 paskelbto konkurso dėl jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, organizuoto pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22¹ straipsnį, sąlygas?

Projektą įgyvendina ne leidimą elektrinių plėtrai ir eksploatacijai gavusi UAB „Offshore wind farm 1“, o jos akcininkė UAB „Ignitis renewables“ – tai neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir konkurso sąlygų reikalavimo.



Konkurso metu UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ pakeitė esmines jungtinės veiklos sutarties sąlygas dėl bendradarbiavimo projekte ir jo finansavimo ir apie tai neinformavo VERT.



Leidimas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išduotas UAB „Offshore wind farm 1“, tačiau faktiškai projektą įgyvendina šios bendrovės akcininkė UAB „Ignitis renewables“.



Rekomendacijos

UAB „Ignitis renewables“:

- ✓ Perduoti sukurtą turtą, darbus ir įsipareigojimus projekto bendrovei UAB „Offshore wind farm 1“ ir užtikrinti, kad ji įgyvendintų projektą.

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai:

- ✓ Įvertinti, ar projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“ vykdo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 22¹ straipsniuose nurodytas sąlygas.
- ✓ Konkursų sąlygose numatyti pareigą konkursų dalyviams pateikti pilnos apimties dokumentus ir konkurso metu pasikeitusią informaciją.



2. Ar kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių – UAB „Ignitis renewables“ ir „OW Offshore, S. L.“ – dera su numatytomis gauti naudomis?




Kol UAB „Ignitis renewables“ buvo neišpirkusi partnerio „OW Offshore, S. L.“ akcijų projekto bendrovėje, kaštų ir atsakomybių pasidalijimas tarp projekte dalyvaujančių jungtinės veiklos partnerių nederėjo su numatytomis gauti finansinėmis naudomis (pelno paskirstymu).

100 proc. Konkurso metu projekto įgyvendinimo kaštų prisiėmė vienas projekto partnerių - UAB „Ignitis renewables“.

Išlaidos ir įsipareigojimai	Pagal pirminį susitarimą		Pagal konkurso metu pakeistą susitarimą	
	UAB „Ignitis renewables“	„OW Offshore, S.L.“	UAB „Ignitis renewables“	„OW Offshore, S.L.“
➤ Vystymo mokestis valstybei	10,2 mln. Eur	9,8 mln. Eur	20,0 mln. Eur	0 Eur
➤ Prievolių įvykdymo užtikrinimas AB „Litgrid“, garantuojant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokole nurodytų įsipareigojimų įvykdymą	26,8 mln. Eur	25,7 mln. Eur	52,5 mln. Eur	0 Eur
➤ Atsakomybė finansuoti projekto bendrovę / projektą	51 proc.	49 proc.	100 proc.	0 proc.

51/49 proc.



Partneriams įsteigus projekto bendrovę UAB „Offshore wind farm 1“, jos akcijos pasidalintos santykiu 51 proc. – UAB „Ignitis renewables“, 49 proc. – „OW Offshore, S.L.“. Pelną abu partneriai turėjo dalintis pagal turimų akcijų kiekį.

Projektas yra vystymo etape – pelnas nebuvo gautas.




3. Ar AB „Ignitis grupė“ ir jos patronuojamosios bendrovės UAB „Ignitis renewables“ finansiniai ištekliai projekte naudoti teisėtai ir efektyviai?



Projekto įgyvendinimą finansuoja tiesiogiai UAB „Ignitis renewables“, o ne tam įsteigta projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“. Pinigai projektiniams jūros dugno tyrimams panaudoti neefektyviai.



Jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus pastatyti vėjo elektrines jūroje atliko ir už juos 40,3 mln. Eur sumokėjo UAB „Ignitis renewables“, o ne leidimą gavusi projekto bendrovė UAB „Offshore wind farm 1“.



Didžioji dalis projektinių jūros dugno tyrimų nukelti vieneriems metams, tačiau šių darbų sutartys ilgiau kaip pusę metų nepakeistos.



Sprendimas projektinius geotechninius jūros dugno tyrimus išskaidyti į du etapus ir pirmu etapu atlikti mažos apimties tyrimus, kurie nėra privalomi statybą leidžiančiam dokumentui gauti, sudarė prielaidas neefektyviam 4 mln. Eur panaudojimui.

Rekomendacija UAB „Ignitis renewables“:

- ✓ Patikslinti su rangovais sudarytas sutartis dėl projektinių jūros dugno tyrimų ir nustatyti realius darbų atlikimo terminus.

Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduriama įgyvendinant projektą, **didėja rizika**, kad projekto įgyvendinimo grafike **numatytu terminu** pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje **nebus pastatytas ir nepradės gaminti elektros energijos**.

62 proc. • (43 iš 69) projektui reikalingų įgyvendinti darbų nukelta vėlesniam laikotarpiui nuo 0,5 iki 20,5 mėn., 51 proc. iš jų daugiau kaip 6 mėn.

27 proc. • Per 2 metus planuota projekto kaina dėl jam įgyvendinti reikalingų konstrukcijų ir įrangos brangimo išaugo 27 proc. (nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. Eur).

~ 40 proc. • Prognozuojama projekto investicijų grąža sumažėjo beveik 40 proc. (nuo 6,74 iki 3,95 proc.).



• Nėra pasirašyti ketinimų protokolai ar ilgalaikės sutartys, pagal kurias elektros energijos vartotojai įsipareigotų įsigyti Baltijos jūroje pagamintą elektros energiją.

Rekomendacija UAB „Ignitis renewables“:

- ✓ Siekiant objektyviai įvertinti, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyto tikslo (iki 2030 m. pastatyti jūrinio vėjo parkus, kurių įrengtoji galia sieks 1,4 GW) pasiekimo galimybę, atlikti su pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko įgyvendinimu susijusių vidinių ir išorinių veiksnių analizę, jos pagrindu numatyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir priimti konkrečius sprendimus dėl tolesnio projekto įgyvendinimo.



Pokyčiai audito metu



UAB „Ignitis renewables“ 2025-10-13 išpirko 49 proc. projekto partnerio „OW Offshore, S. L.“ UAB „Offshore wind farm 1“ akcijų.



UAB „Ignitis renewables“ 2025-11-05 sudarė sutartį su projekto bendrove UAB „Offshore wind farm 1“ dėl teisių ir pareigų perleidimo, kurioje sutarė, kad UAB „Ignitis renewables“ projekto bendrovei perleidžia visas projekto sutartis, teises, interesus ir įsipareigojimus, įskaitant visas nuosavybės ir naudojimo teises į rezultatus, gautus vykdant sutartis ir iki 2025-12-31 perduos visus dokumentus, įrašus ir medžiagą, susijusius su sutartimis ir jų rezultatais.





AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
