





VILNIUS


VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (ITVP) ĮGYVENDINIMAS



INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PASKIRTIS

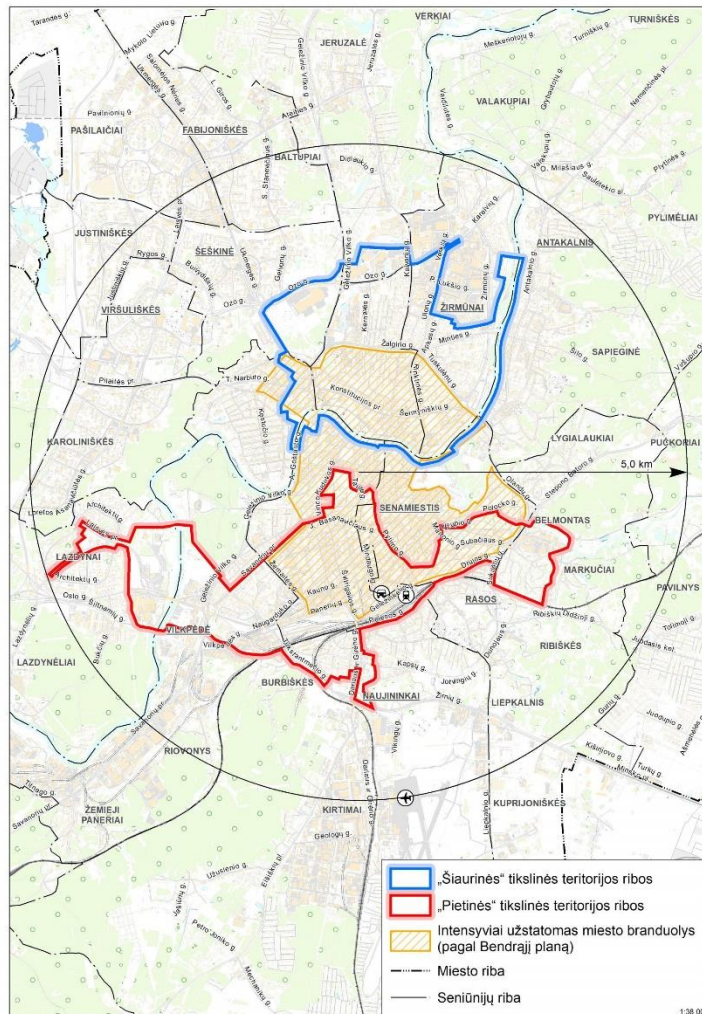

- Nustatyti Vilniaus miesto integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014-2020 metams, siekiant užtikrinti ES, VB ir SB investicijų efektyvumą, jas koncentruojant į Šiaurinę ir Pietinę tikslines teritorijas
- Naujos **Šiaurinės** ir **Pietinės** tikslinių teritorijų ribos (patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-981 „Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“)
- Programoje 79 projektai:

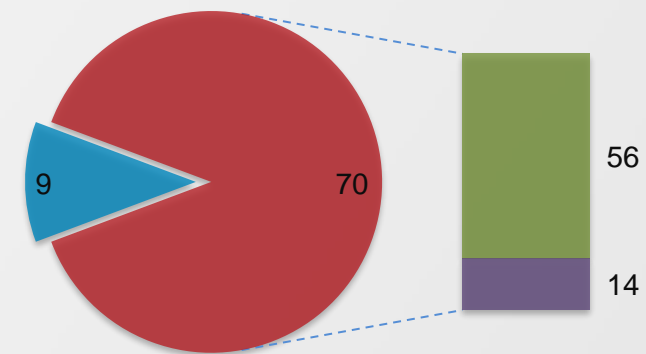

■ Kultūros ministerijos įgyvendinami projektai

■ Savivaldybės įgyvendinami projektai



■ Projektai, kurie finansuojami savivaldybės, valstybės, ES ir kitomis lėšomis

■ Projektai, kurie finansuojami tik savivaldybės lėšomis

INTERAKTYVUS ITV PROGRAMOS TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIS



UAB „ID Vilnius“ palaikomas ITV programos investicinių projektų interaktyvus žemėlapis funkcionalumas: <https://maps.vilnius.lt/projektai>

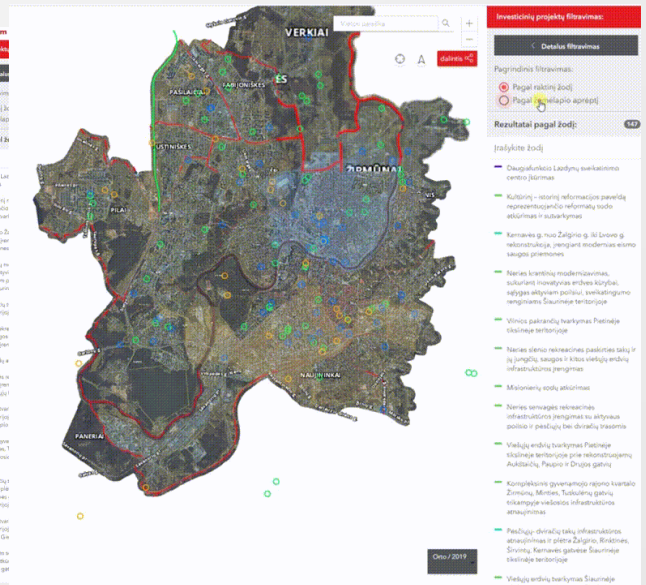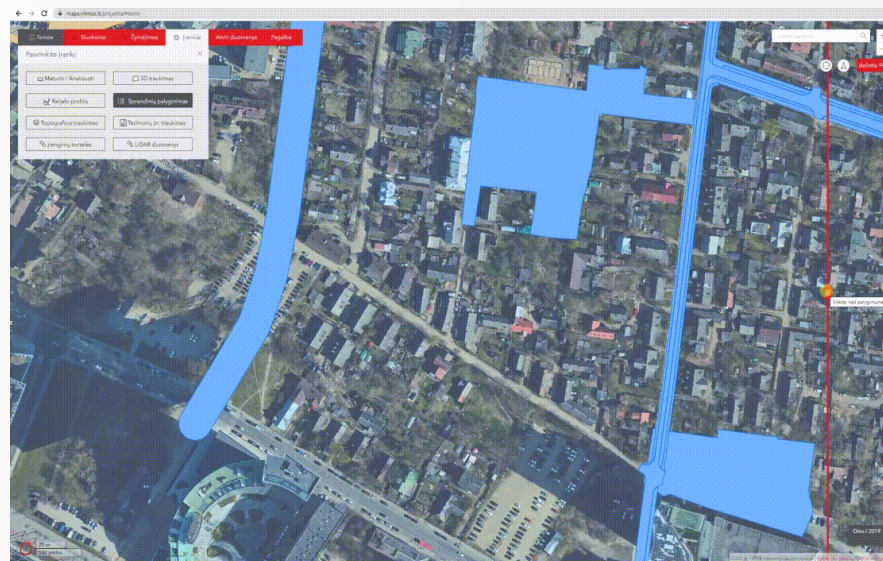

- **Projektų peržiūra**

Aplikacijoje pateikiama detali informacija apie kiekvieną viešinamą projektą. Informaciją galima peržiūrėti žemėlapis aplikacijos lange, paspaudus ant dominančio projekto kontūro. Projekto apraše galima matyti: kas bus atnaujinta / sutvarkyta / pastatyta; nurodomi terminai; projekto vykdytojas; finansavimo šaltiniai.

- **Sprendinių palyginimas**

Įrankis suteikia galimybę vizualiai įvertinti, kaip numatomi projektų sprendiniai pakeis esamą aplinką, kokią įtaką jie turės aplinkinei infrastruktūrai bei kaip jie kontrastuoja su esamu vietovės vaizdu.

ITVP ataskaitos viešinamos <https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/investiciju-projektai/2014-2020-m-vilniaus-miesto-integruotos-teritorijos-vystymo-programa/>


INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



1. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant erdves.


Programos efekto rodiklis

1-E. Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis*

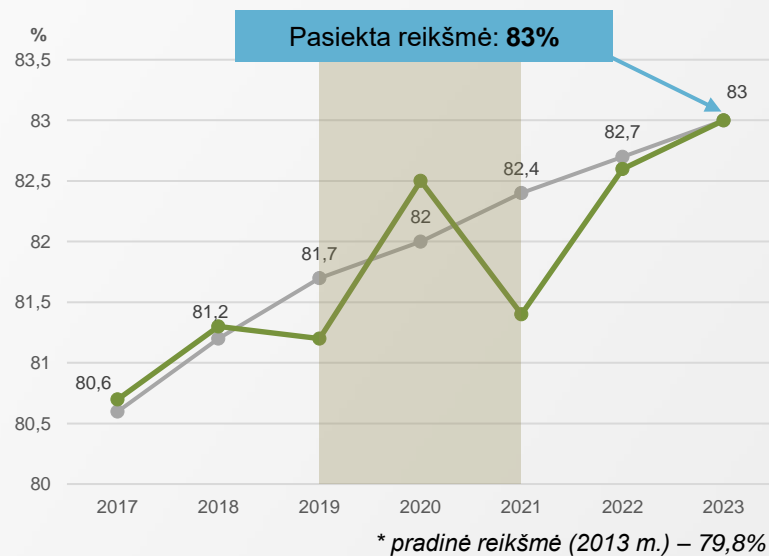

Programos rezultato rodiklis

1-R-1. Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose, informacijos ir ryšių veiklose (tūkst. gyv.)*

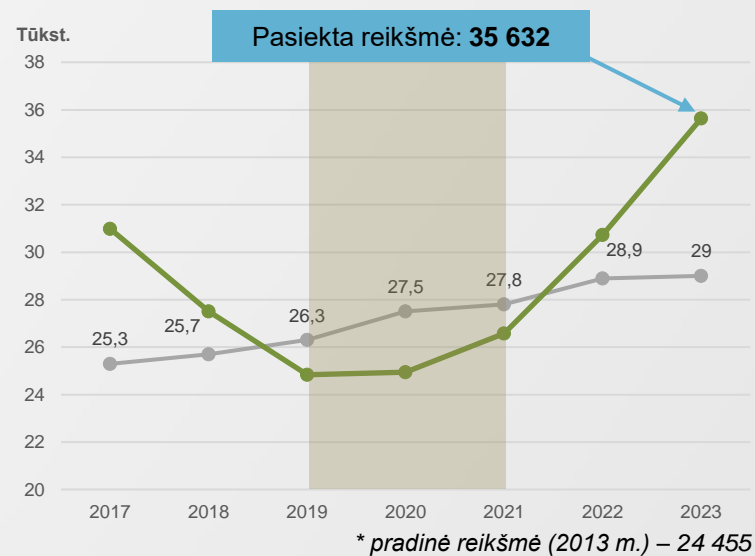

Covid pandemijos laikotarpis
 Siekiama reikšmė
 Pasiekta reikšmė


INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.


Programos efekto rodiklis

2-E. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.)*

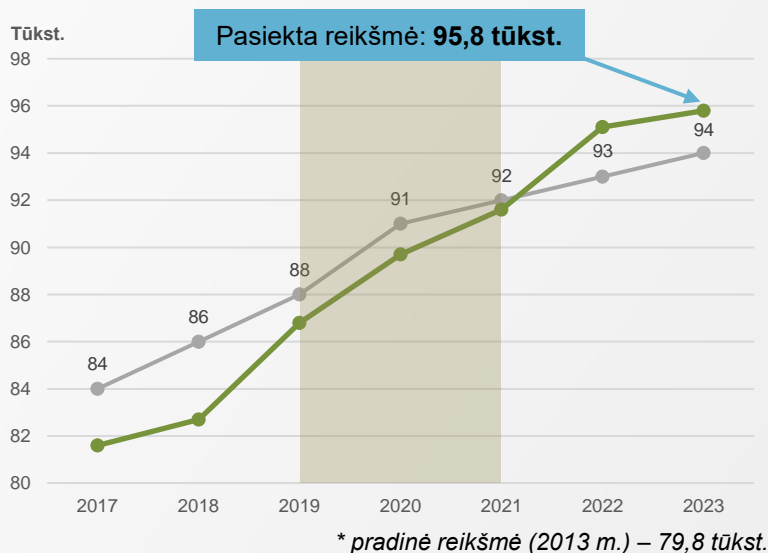

Programos rezultato rodiklis

2-R-1. Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (tūkst. gyv.)*

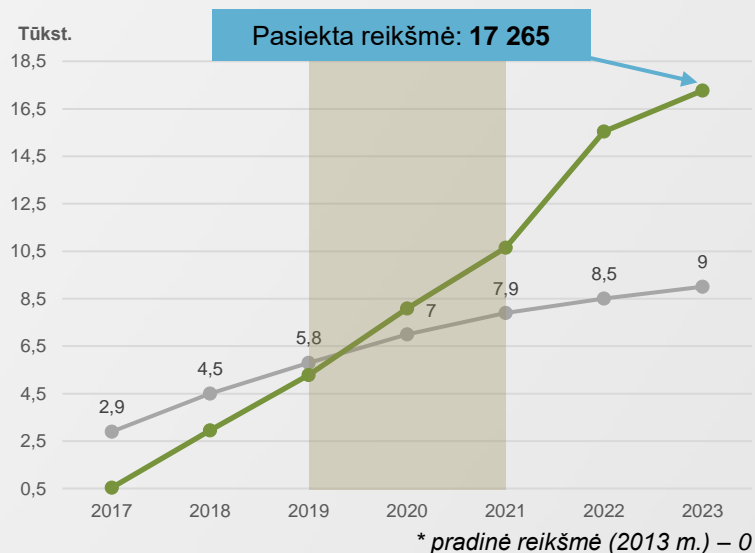

Covid pandemijos laikotarpis Siekima reikšmė Pasiekta reikšmė


INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.

Programos rezultato rodiklis


2-R-2. Jaunimo skaičius 1 000 gyventojų
tikslinėse teritorijose*

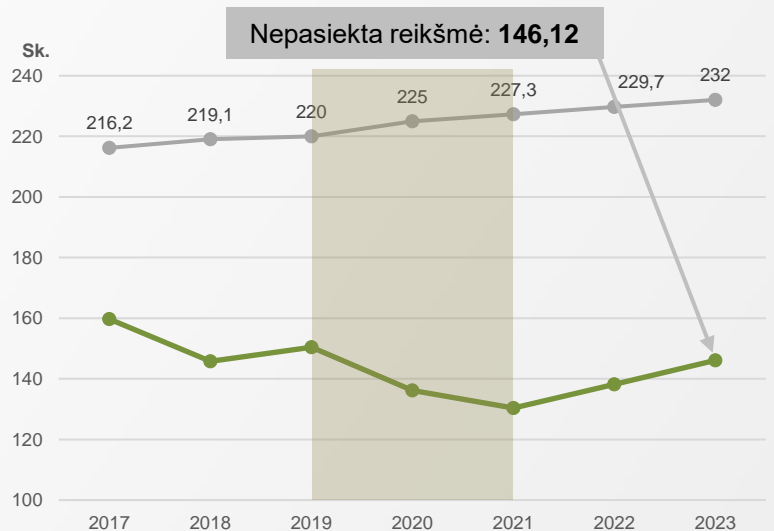

* pradinė reikšmė (2013 m.) – 207,8

Programos rezultato rodiklis

2-R-3. Viešojo transporto naudojimas
(mln. kelionių per metus)*

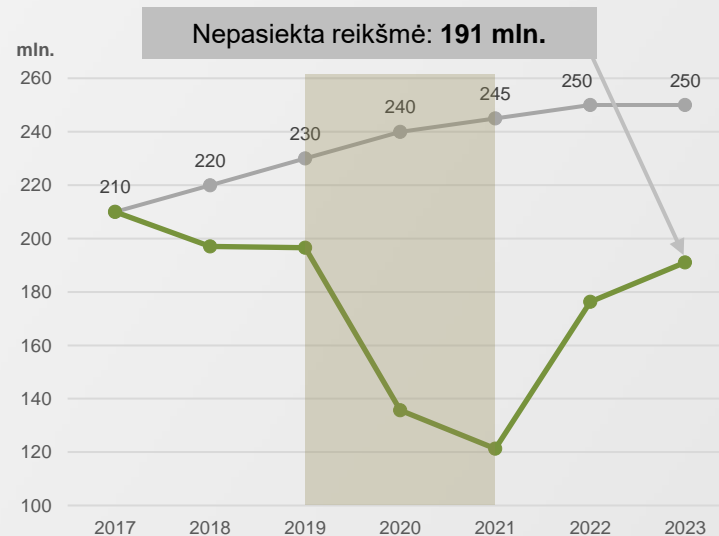

* pradinė reikšmė (2013 m.) – 200,6 mln.

Covid pandemijos laikotarpis Siekiama reikšmė Pasiekta reikšmė

INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.

Programos nepasiekto rodiklio galimos priežastys

2-R-2. Jaunimo skaičius 1 000 gyventojų
tikslinėse teritorijose*

Nepasiekta reikšmė: **146,12**

- didesnės būsto eksploatacinės išlaidos (nuoma, komunaliniai mokesčiai ir kt.) tikslinėse teritorijose nei periferinėse zonose;
- gyvenamosios vietos nedeklaravimas (studentų bendrabučiuose, esančiuose tikslinėse zonose ar nuomojamuose būstuose).

Programos nepasiekto rodiklio galimos priežastys

2-R-3. Viešojo transporto naudojimas
(mln. kelionių per metus)*

Nepasiekta reikšmė: **191 mln.**

- Covid pandemija;
- išaugęs alternatyvių judėjimo mieste transporto priemonių pasirinkimas (automobilių, el. paspirtukų dalijimosi paslaugos).

SUPLANUOTOS INVESTICIJOS PAGAL VILNIAUS ITVP



	Iš viso pagal Vilniaus ITVP veiksmų planą, Eur	ES lėšos, Eur	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Privačios lėšos, Eur	Kitos viešosios lėšos, Eur
Iš viso pagal viešąsias priemones	503 608 474	277 251 026*	73 123 033*	142 203 652	10 340 764	690 000

* ES ir VB lėšos su Kultūros ministerijos valstybiniais projektais.

SUPLANUOTOS INVESTICIJOS PAGAL VILNIAUS ITVP BE KULTŪROS MINISTERIJOS VALSTYBINIŲ PROJEKTŲ

	Iš viso pagal Vilniaus ITVP veiksmų planą, Eur	ES lėšos, Eur	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Privačios lėšos, Eur	Kitos viešosios lėšos, Eur
Iš viso pagal viešąsias priemones	458 432 304	239 989 191	65 898 698	142 203 652	10 340 764	0

ITVP ĮGYVENDINIMO LĖŠŲ ĮVYKDYMAS



	Iš viso, Eur	ES lėšos, Eur	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Privačios lėšos, Eur
Iš viso pagal viešąsias priemones iki 2023 12 31 gautos lėšos*	299 130 146	246 971 056	8 595 365	43 563 725

	Iš viso, Eur	ES lėšos, Eur	Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Privačios lėšos, Eur
Iš viso pagal viešąsias priemones projektams gautos lėšos per 2023-us metus*	25 337 411	19 544 940	499 422	3 787 610	1 505 440

* Lėšos be Kultūros ministerijos valstybinių projektų

Viso iki 2023-12-31 projektams išmokėta ES ir VB lėšų – 255 035 698,25 Eur, tai sudaro: 88 % nuo ITVP suplanuotų visų ES ir VB lėšų

ITVP ĮGYVENDINIMAS



ITVP programoje buvo numatyta įgyvendinti 79 projektus:

- 70 projektų Vilniaus miesto savivaldybės
- 9 projektai Kultūros ministerijos valstybiniai projektai

Per visą programos laikotarpį įgyvendinti 52 projektai:

- 49 projektai Vilniaus miesto savivaldybės (iš jų 5 projektai 2024 m.)
- 3 projektai Kultūros ministerijos

Šiuo metu 27 projektai įgyvendinami iš jų:

- 6 projektai Kultūros ministerijos
- 11 projektų Savivaldybės biudžeto lėšomis
- 10 projektų Europos Sąjungos, Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis

ITVP ĮGYVENDINIMAS


11 projektų Savivaldybės biudžeto lėšomis

- 1. Daugiafunkcinis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas;
- 2. Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis (*Nacionalinio stadiono koncepcijos projektas*)
- 3. Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui; 4. Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas (*įtraukti į 2024-2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos projektą*)
- 5. Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves (*susijęs su Geležinkelių stoties architektūriniu konkurso projektu ir detaliojo plano tvirtinimu*)
- 6. Pėsčiųjų dviračių tilto per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) įrengimas ir viešosios erdvės sutvarkymas (*techninio projekto koregavimas dėl detaliojo plano*)
- 7. Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija (*apjungtas į Neries krantinių projektą*)
- 8. Valstybinio Sapielių parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui (*atsisakyta, ES lėšos perkeltos į Trakų Vokės parko projektą*)
- 9. Misionierių sodų atkūrimas (*atsisakyta, ES lėšos perskirstytos kitiems projektams*)
- 10. Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones (*įgyvendintas*)
- 11. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37 ir jo prieigų sutvarkymas (*vykdomi rangos darbai*)

2024 M. 10 ES PROJEKTŲ BUS ĮGYVENDINTI:



1. Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba
2. Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (Neries kairė)
3. Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g.
4. Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje
5. Vilniaus miesto savivaldybės neformalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas
6. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste
7. Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas *(jau įgyvendintas)*
8. Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje
9. Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones
10. Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje

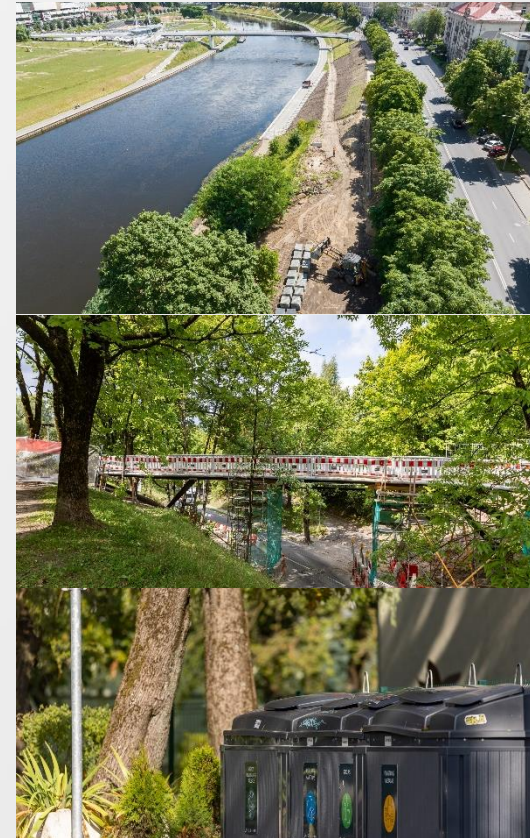

Jeigu vadovaujantis PAFT (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1.3 papunkčiu projekto veiklos nebaigiamos ir (arba) projekto rezultatai nepasiekiami iki 2023 m. gruodžio 31 d., projekto vykdytojas įsipareigoja po šio termino patirtas išlaidas apmokėti nuosavomis lėšomis ir užbaigti projektą įgyvendinti bei pasiekti projekto rezultatus iki 2024 m. liepos 31 d.

ITVP ĮGYVENDINIMO PERIODU IŠMOKTOS PAMOKOS



- Peržiūrėta Savivaldybės projektų valdymo tvarka, išgrynintos projektų valdymo organizacinės struktūros, rolės, atsakomybės. Ankstyvas suinteresuotų šalių įtraukimas (visuomenės įtraukimas, kūrybinės dirbtuvės, rinkos konsultacijos).
- Vykdoma išankstinė projektų ir projektų įgyvendinimui numatytų teritorijų, sklypų analizė, rizikų identifikavimas.
- Didelis dėmesys skiriamas projektavimui ir viešiesiems pirkimams.

Techninis projektas – prieš skelbiant rangos pirkimą įvertinti TP sprendinius, kad į rangos pirkimus projektas patektų kuo tikslesnis – išvengiant techninių klaidų ir pakeitimų.

Pirkimai – kuo tiksliau įvertinti pirkimo vertę, atlikti rinkos konsultacijas.

Ranga – rangos sąlygų vykdymas (draudimų pratęsimai), tinkamai įforminti visus pakeitimus subrangovų pakeitimus ir pan.

- Projektus teikti ES investicijoms gauti parengus techninius projektus.
- Reikšmingos priežastys lėmusios projektų užbaigimo terminus - statybos projektų užbaigimo dokumentacijos tvarkymas, pasikeitę teisės aktai ir pan.

ARTIMIAUSI DARBAI



- **2024-05-15 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMAS TVIRTINTI
2024 – 2029 M. VILNIAUS MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS**
[Vilniaus miesto savivaldybė - 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos projektas \(vilnius.lt\)](https://vilnius.lt)

	Preliminarus Strategijos veiksmų (17 projektų) finansavimo poreikis, €			
	Bendras lėšų poreikis, €	Iš jų:		
		ES fondų lėšos	LR VB bendrojo finansavimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš viso:	77,826,123.63	35,367,471.21	18,323,736.21	24,134,916.21

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Projektų valdymo skyriaus vedėja Lina Melianienė, lina.melianiene@vilnius.lt
Infrastruktūros grupės patarėjas Arūnas Visockas, arunas.Visockas@vilnius.lt

2024-05-15
