





VERTINIMO ATASKAITA

LIETUVOS EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO RODIKLIŲ PASIEKIMO RIZIKŲ VALDYMAS

2025 m. sausio 29 d.


Pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę Lietuvai skirtas 3 849,2 mln. Eur finansinis įnašas, kuriam gauti reikia pasiekti 218 rodiklių iki 2026-08-31.

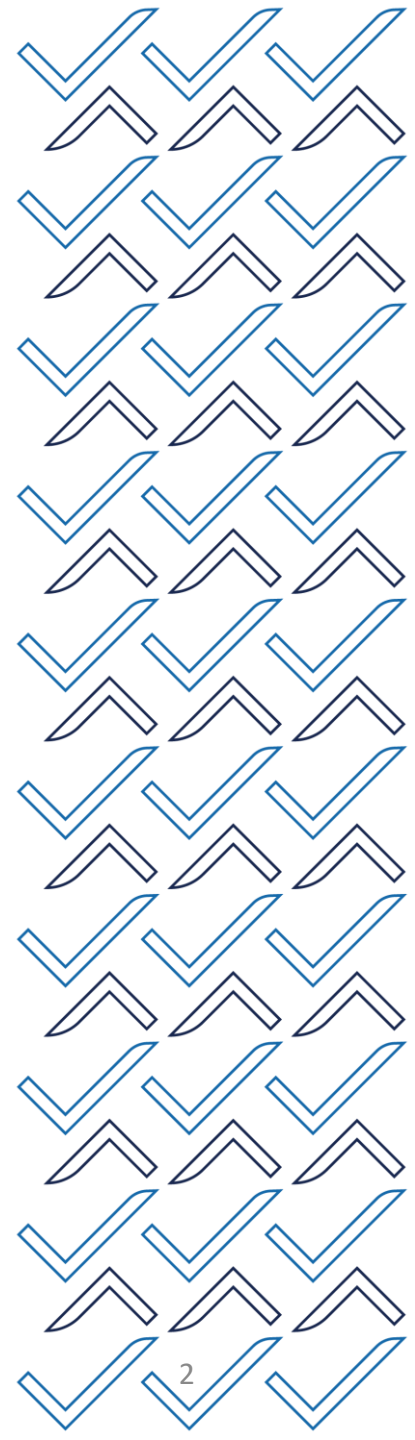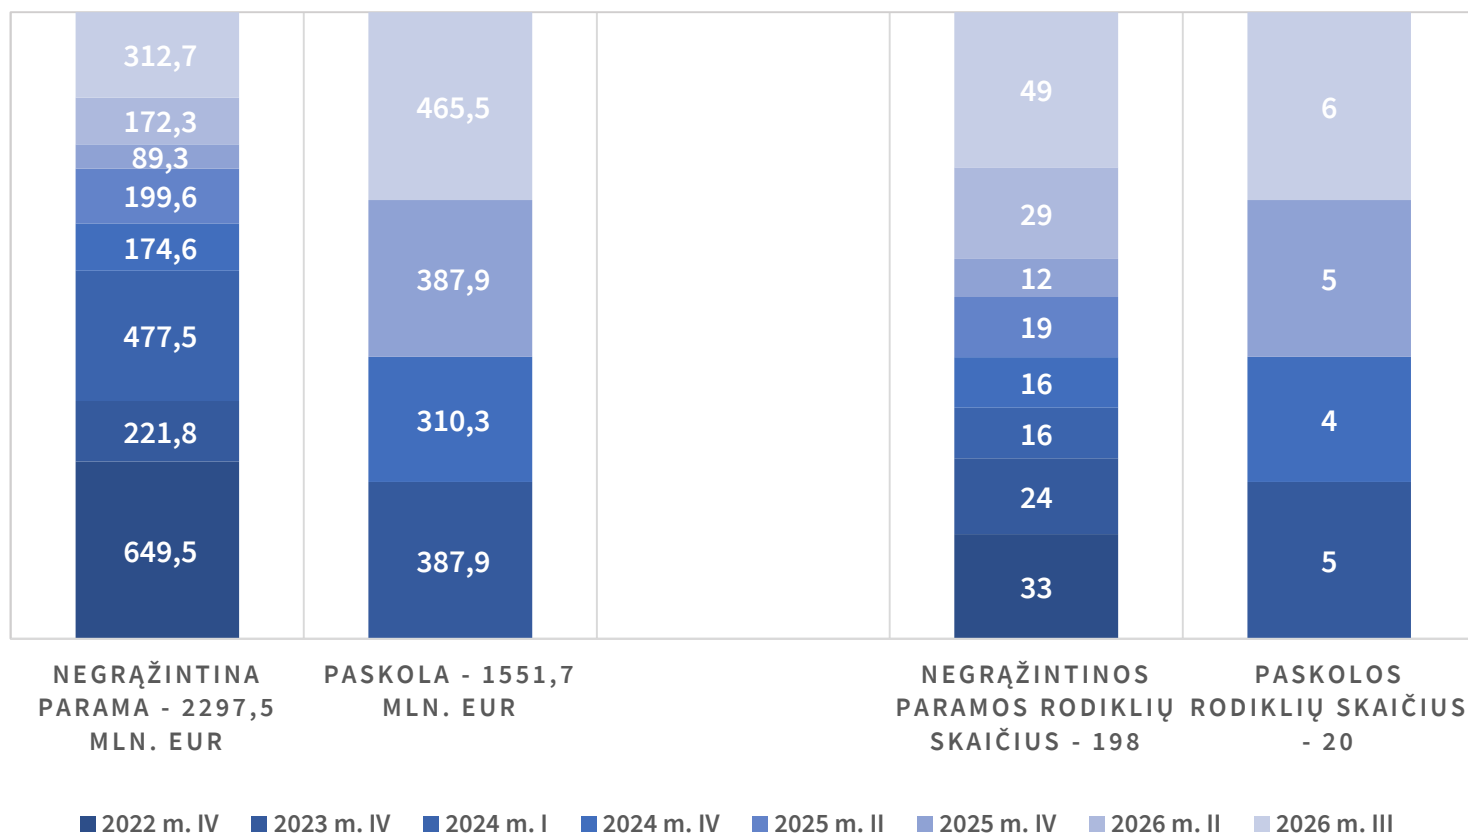

Vertinimo tikslas – įvertinti pažangą įgyvendinant Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir rizikas, siekiant vėliausio laikotarpio rodiklių.

Vertinamieji subjektai – Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Vertinamas laikotarpis – nuo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo 2021-07-28 iki 2024-09-30. Pokyčiams įvertinti, naudoti ir vėlesnių laikotarpių duomenys.

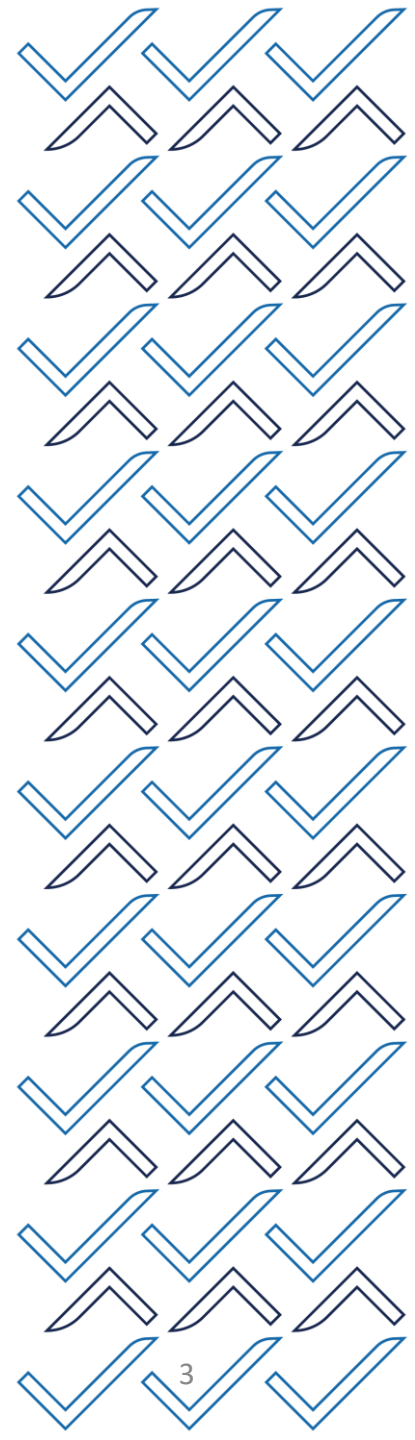

Rodiklių pasiekimo statistika iki 2024-11-26

Mokėjimo prašymo pateikimo terminas	Paramos dalys	Rodiklių Nr.										
		NEGRAŽINTINOS PARAMOS RODIKLIAI										
2022 m. IV ketv.	I	21	28	29	37	43	44	70	83	84	89	
		91	93	94	95	105	110	112	116	126	127	
		128	132	142	144	146	152	155	168	179	182	
		185	186	188								
2023 m. IV ketv.	II	1	2	3	27	50	57	60a	64	68	69	
		76	80	92	99	106	107	115	129	151	156	
		158	180	184	201							
2024 m. I ketv.	III	4	5	6	18	48	58	108	121	122	143	
		145	147	153	154	177	183					
2024 m. IV ketv.	IV	15	67	79	81	103	104	124	139	148	149	
		150	157	159	160	169	181					
2025 m. II ketv.	V	10	25	34	40	55	62	65	71	102	111	
		125	135	148a	162	172	175	197	198	202		
2025 m. IV ketv.	VI	8	11	16	22	31	35	38	51	53	96	
		176	190									
2026 m. II ketv.	VII	7	9	12	13	14	17	19	20	30	41	
		45	52	72	78	82	85	123	130	131	133	
		141	163	164	170	171	173	174	187	199		
2026 m. III ketv.	VIII	13a	26	32	33	36	39	42	46	47	54	
		56	59	60b	60c	61	63	66	73	74	75	
		77	88	90	97	98	100	101	109	113	114	
		117	118	119	120	134	136	137	138	161	165	
		166	167	178	189	191	195	196	200	203		
PASKOLOS RODIKLIAI												
2023 m. IV ketv.	I	58a	137a	180a	192	194						
2024 m. IV ketv.	II	58b	180c	204	205							
2025 m. IV ketv.	III	137b	137c	137d	180d	206						
2026 m. III ketv.	IV	180b	193	137e	137f	207	208					

Nepasiekti rodikliai, dėl kurių 9 mėn. vėluojama pateikti 477,5 mln. Eur mokėjimo prašymą

Rodiklio Nr. ir pavadinimas	Atsakinga ministerija
Nr. 108 „Pradėjusi veikti vieno langelio principu veikianti mokymosi visą gyvenimą informacinė sistema“. Investicinis rodiklis.	ŠMSM
Nr. 143 „Įsigalioję mokesčių teisės aktų pakeitimai dėl mokesčių lengvatų ir specialių apmokestinimo režimų atsisakymo“.	FM
Nr. 145 „Įsigalioję akcizų ir aplinkosauginių mokesčių bei turto mokesčių teisės aktų pakeitimai“.	FM
Nr. 147 „Įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, numatant jų taikymą ne anksčiau kaip 2024 m.“.	FM
Nr. 183 „Įsigaliojęs Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo padidinama nedarbo socialinio draudimo sistemos aprėptis“.	FM
Nr. 153 „Įsigaliojęs teisės aktų paketas, įtvirtinantis sąlygas ir nuostatas dėl ilgalaikių strateginių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų naudojimo“.*	FM

* Pagal naujausią informaciją, gautą vertinimui pasibaigus, rodiklis pasiektas.

- Pasiekti rodikliai ir EK pateiktas mokėjimo prašymas
- Rodiklis pasiektas ne visa apimtimi su finansine korekcija
- Pasiekti rodikliai, bet mokėjimo prašymas EK dar nepateiktas
- Siekiami rodikliai

Atsiskaitymas už pasiektus rodiklius iki 2024-11-30


Paramos dalis	Mokėjimo prašymo pateikimo EK orientacinis terminas	Rodiklių skaičius	Paramos vertė neatskaičius avanso, mln. Eur	Pateiktas mokėjimo prašymas EK	Rodiklių skaičius	Paramos vertė neatskaičius avanso, mln. Eur
	PLANAS			FAKTAS		
Negrąžintina parama						
I	2022 m. IV	33	649,5	2022 m. IV	33	649,5
II	2023 m. IV	24	221,8	2024 m. III	24	221,8
III	2024 m. I	16	477,5	Nepateiktas		
IV	2024 m. IV	16	174,6	Nepateiktas		
	Iš viso:	89	1 523,4	Iš viso:	57	871,4
Paskola						
I	2023 m. IV	5	387,9	2023 m. IV	5	387,9
II	2024 m. IV	4	310,3	2024 m. III	4	310,3
	Iš viso:	9	698,2	Iš viso:	9	698,2
	Iš viso parama:	98	2 221,6	Iš viso parama:	66	1 569,6

Investicijų įgyvendinimo būklė iki 2024-11-30

	Negrąžintina parama		Paskola	
	mln. Eur	proc.	mln. Eur	proc.
Skirta Lietuvai	2 297,6	-	1 551,7	-
Paskelbta kvietimų	2 273,5	99,0	-	-
Sudaryta sutarčių su projektų vykdytojais arba Nacionaline plėtros įstaiga	2 017,7	87,8	1 551,7*	100
Išmokėjimai projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai	542,8	23,6	458,9	29,6

* 150 mln. Eur skirta Vyriausybės 2024-05-29 nutarimu Nr. 420 Nacionalinės plėtros įstaigos įstatiniam kapitalui didinti.

Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimas

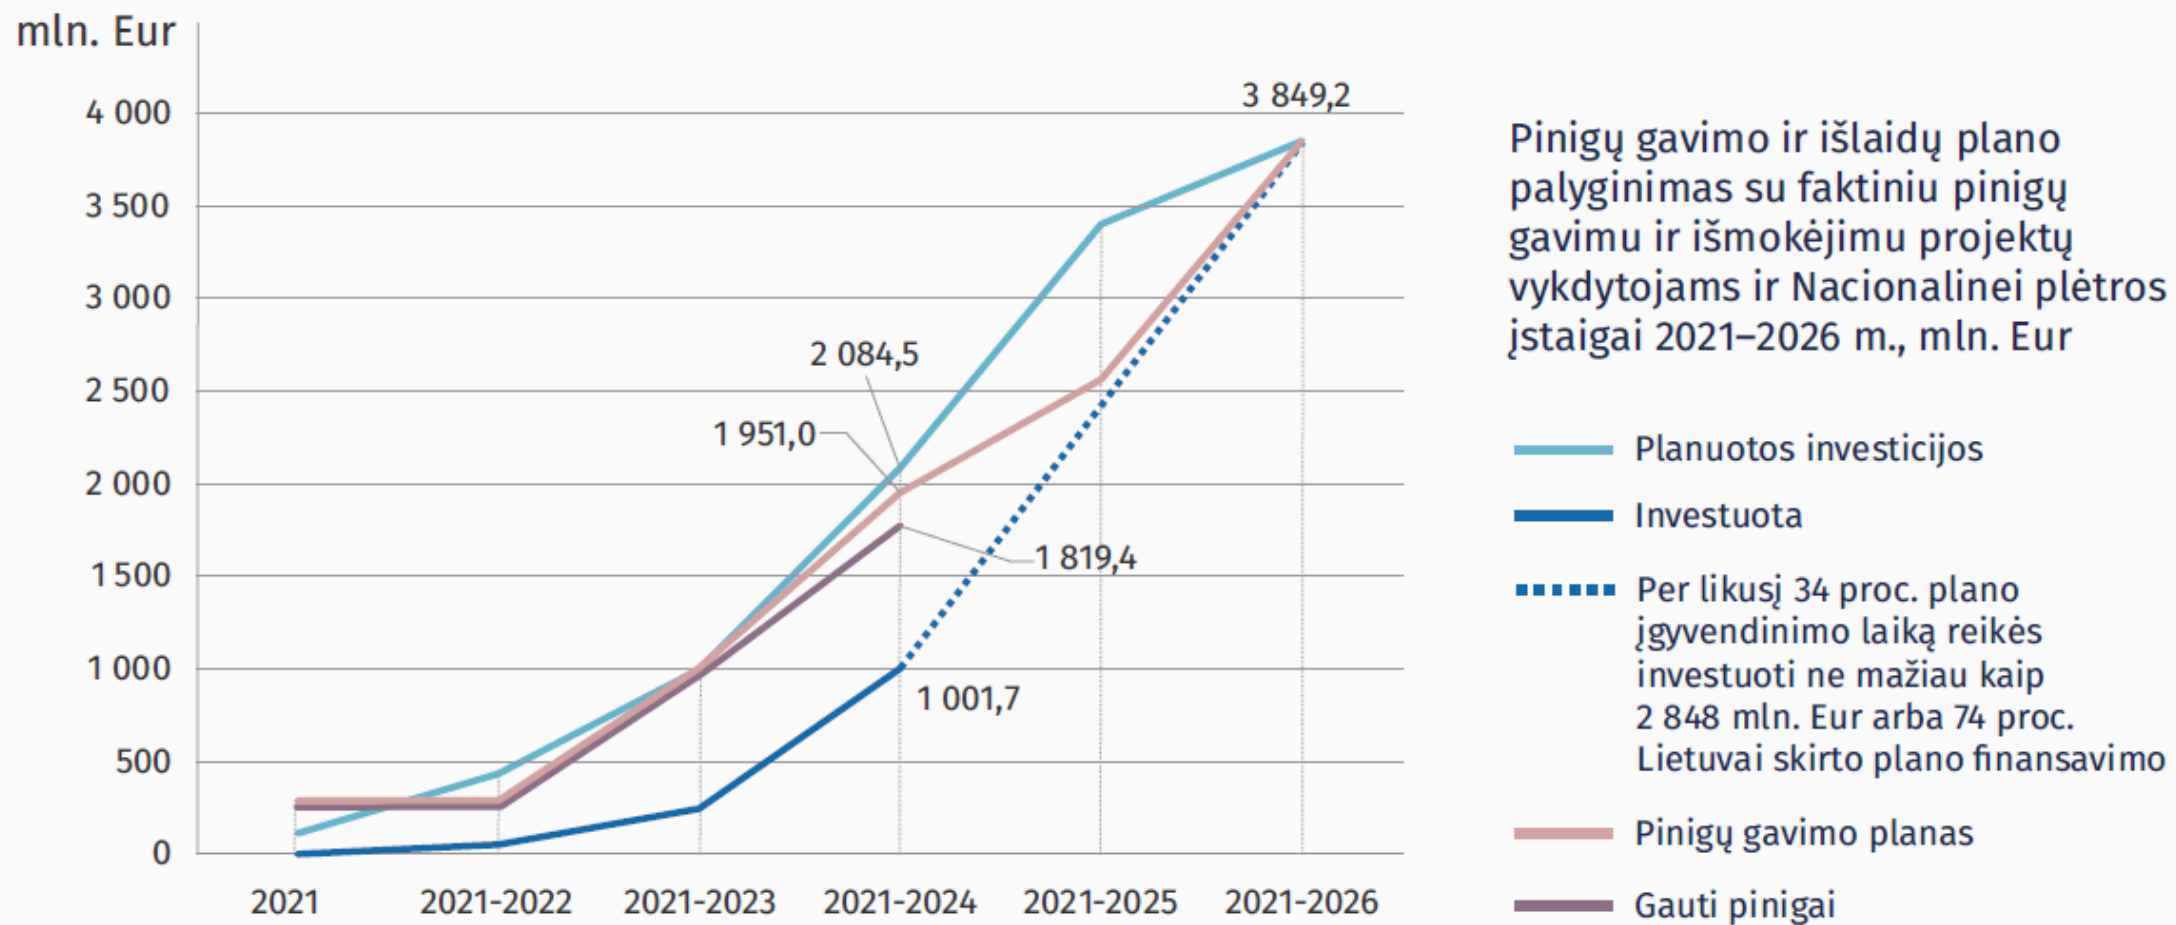

Ministerijos imasi veiksmų rizikoms valdyti, tačiau pasiekta rodiklių būklė rodo, kad planuoti pokyčiai bus įvykdyti ne visa apimtimi

Vertinome rizikingumą 45 iš 106 rodiklių, kurių pasiekimo terminas 2025-2026 m.

12 rodiklių nebus pasiekti planuota apimtimi

Rodikliai susiję su netaršių transporto priemonių įsigijimu, viešų ir privačių įkrovimo prieigų įrengimu, startuolių ekosistemos plėtros skatinimu, mokslo ir verslo skatinimu dalyvauti tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose, užimtumo rėmimo priemonių didinimu, orientuojantis į aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, skaitmeninę ir žaliąją transformaciją.

2 rodikliai nebus pasiekti laiku, tačiau tikėtina, kad galutiniai tikslai bus įgyvendinti

Rodikliai susiję su individualių elektros energijos kaupimo įrenginių montavimu ir netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimu.

17 rodiklių pasiekimo eiga rodo rizikas plano įgyvendinimui laiku ar visa apimtimi

Rodikliai susiję su pažangios terapijos centro sukūrimu, sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimu, misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimu, elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų didinimu, parengiamaisiais jūrinių vėjo elektrinių plėtros ir infrastruktūros įrengimo darbais, elektroninės kelių rinkliavos sistemos įdiegimu, elektrinių autobusų surinkimu ir modifikavimu, biometano dujų gamybos įrenginių statyba, lietuvių kalbos išteklių, reikalingų kuriant dirbtinio intelekto sprendimus, kūrimu, kolegijų pertvarkos projektų įgyvendinimu.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

AUGUSTĖ PURLIENĖ
Vyriausioji valstybinė auditorė –
grupės vadovė
